


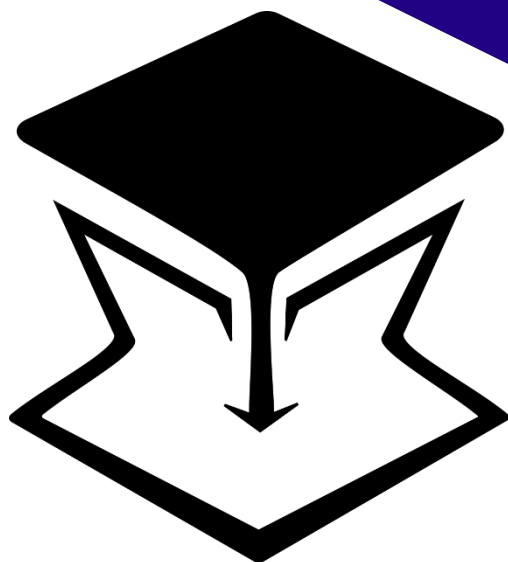

SIGMA

Plan de Iteración

Fase Construcción, Iteración 6

SIGMA

3-BYTE Team

Adrián PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS

Laboratorio de Desarrollo de Software
Unidad Académica Río Gallegos
Universidad Nacional de la Patagonia Austral

3-BYTE
TEAM



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.




Tabla de contenido

Introducción	4
<i>Propósito</i>	<i>4</i>
<i>Referencias</i>	<i>4</i>
Objetivos	4
<i>Criterios de Evaluación</i>	<i>4</i>
<i>Elementos de la Línea Base</i>	<i>5</i>
Planificación	5
Casos de Uso y Escenarios	7
Recursos	7
Evaluación []	8
<i>Objetivos Alcanzados</i>	<i>8</i>
<i>Objetivos No Alcanzados</i>	<i>8</i>
<i>Elementos incluidos en la Línea Base</i>	<i>8</i>
Conclusión	8

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

- Identificación y Evaluación de Riesgos
- Plan de Estimación
- Plan de Calidad

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar la 6° Iteración de la Fase de Construcción, se esperan finalizar los siguientes documentos:

- Revisión de documentos asociados al proyecto:
 - Plan de SQA
 - Plan de Proyecto
 - Plan de Pruebas
 - Modelo de Datos
 - Modelo de CU
 - Modelo de Diseño

Esta iteración comienza el día lunes 20/01/2025 y finaliza el día lunes 03/02/2025.

Elementos de la Línea Base

Al momento de elaborar el presente Plan, se encuentra disponible la siguiente documentación en la Línea Base:

- Estándar de Documentación
- Resumen de 1° Entrevista
- Modelo de Negocio
- Estudio de Factibilidad
- Documento “Revisión UARGFlow”
- Estudio de mercado y propuestas
- Propuesta de Desarrollo
- Identificación Inicial de Riesgos + actualización #2
- Especificación de Requerimientos
- Plan de Riesgos
- Plan de Calidad
- Gestión de Configuración
- Manejo de Ambiente Controlado
- Estándar de Programación
- Modelo de Datos
- Modelo de Diseño
- Arquitectura del Sistema

Planificación

Se presenta la planificación para la **Iteración #6 de la Fase Construcción**:

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Principal Responsable
Reunión de equipo	20/01/25	20/01/25	TODOS
Revisión de Modelo de Datos	20/01/25	22/01/25	TODOS
Revisión de Especificaciones de TODOS los CU	23/01/2025	27/01/25	TODOS
Revisión del Modelo de Diseño	28/01/25	29/01/25	Diego
Revisión del Modelo de CU	28/01/25	29/01/25	Franco
Revisión del Plan de Proyecto	30/01/25	31/01/25	Diego

Revisión del Plan de SQA	31/01/25	01/02/25	Diego
Revisión del Plan de Pruebas	30/01/25	02/01/25	Franco
Redacción memoria	24/01/25	03/01/25	Glenda
Preparar demo presentación aplicación	01/02/2024	03/02/2024	Diego
Cierre de iteración Reunión de equipo Envío de memoria al equipo docente	03/02/2024		TODOS

Casos de Uso y Escenarios

En esta iteración no se implementarán Casos de Uso

Recursos

En materia de Recursos Humanos, el equipo 3-BYTE Team contará con la participación de todos sus integrantes en esta iteración: Adrian PORTILLO, Glenda FLORES y Franco ROSAS.

En relación a Recursos informáticos, todos los integrantes de 3-BYTE Team cuentan con notebooks personales, que les permitirán avanzar en las tareas designadas en esta iteración, como así también con conexión a internet. Dado que todas las reuniones del equipo son virtuales, se utiliza la plataforma Meet.

Evaluación []

No disponible

Objetivos Alcanzados

Objetivos No Alcanzados

Elementos incluidos en la Línea Base

Conclusión
